



Leistungsverzeichnis

Ihre Baubeschreibung

Die nachfolgende Baubeschreibung bezieht sich explizit auf den von Ihnen konfigurierten Liefer- und Leistungsumfang. Weitergehende Beschreibungen des bei KAMPA erhältlichen Portfolios entnehmen Sie bitte unserer Broschüre „Allgemeine Bau- und Lieferbeschreibung“, diese beschreibt detailliert den konstruktiven Aufbau des KAMPA Kellers und des KAMPA Holzbaus. Die Premiumqualität des KAMPA Hauses hinsichtlich Materialauswahl, Bauausführung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist daraus ablesbar. Für die technische Gebäudeausstattung legt KAMPA großen Wert auf den Einsatz hochwertiger Markenfabrikate mit ausgeprägter Energieeffizienz, ideal passend zur energetischen Qualität der KAMPA Gebäudehülle. Für den Innenausbau bietet KAMPA eine breite Palette attraktiver Materialien und Komponenten, ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Die KAMPA Ausstattungsberater unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres komplett individuellen KAMPA Traumhauses: Raum für Raum, inklusive Bad, Küche und Sauna, auf Wunsch bis hin zur Möblierung und Dekoration.

Der Ihrem Bauvertrag zugrunde liegende Liefer- und Leistungsumfang ergibt sich aus dem nachfolgenden „Individuellen Bau- und Leistungsverzeichnis“, welches als Anlage zum Bauvertrag vereinbart wird.



Bauweise & Konstruktion

Individuelle Planung

Jedes KAMPA Haus wird nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der zukünftigen Bewohner gestaltet und gebaut. So entstehen einzigartige und facettenreiche Häuser, die die volle Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Holzbaus nutzen, um eine breite Palette von Stilen zu verwirklichen. Unsere sechs Architekturlinien dienen als Inspirationsquelle und decken die gesamte Vielfalt an Bauarten ab, angefangen beim Bungalow bis hin zum Etagenhaus, vom Flachdach bis zum Satteldach, von klaren Formen bis hin zu verwinkelten Dachschrägen. Zudem werden unsere Fertighäuser von Anfang an gemeinsam mit Ihnen entworfen und geplant, um eine maximale Personalisierung und Individualisierung zu ermöglichen. Gemeinsam können wir Ihr Traumhaus gestalten und Träume wahr werden lassen.



Anforderungen

Die KAMPA Konstruktion und Bauweise als Basis für dieses Leistungsverzeichnis erfüllt die Anforderungen an ein energieeffizientes und nachhaltiges Gebäude gemäß den Richtlinien des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Dieser Standard wird mit dem QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude) ausgezeichnet und mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEE) durch die KfW Bank mit der höchsten staatlichen Förderung belohnt.



GRÜNDUNG

THERMOFUNDAMENTPLATTE

Die Angabe der Ausschachtungstiefe erfolgt unter Bezug auf die Einmessung des Geometers durch die Fachbauleitung. KAMPA erbringt folgende Leistungen:



- Der Funktionspotentialausgleichsleiter ist mit einer Anschlussfahne für Strom- und Wasserleitungserdung ausgestattet. Er wird umlaufend am Rand der Fundamentplatte auf der unteren Bewehrung befestigt. Der bauseitig im Erdreich unterhalb der Fundamentplatte (bei Bettungspolstern und Frostriegeln) zu verlegende umlaufende Ringerder aus Edelstahl wird gemäß DIN 18014 mit dem Funktionspotentialausgleichsleiter von KAMPA verbunden.
- Für den Fall, dass betonierte Frostschrüzen erforderlich sind und diese von KAMPA ausgeführt werden, wird auch der umlaufende Ringerder von KAMPA eingebaut.
- KG-Entwässerungsleitungen DN 100, unter der Fundamentplatte bis Fundamentaußenkante, bis zu 20 lfm, einschließlich bis zu 6 Anschlüssen, Anlegen aller Aussparungen
- Bis zu 3 Stück Leerrohre DN 100, bis zu 10 lfm, jeweils bis zur Fundamentaußenkante, einschließlich Formstücke, Anlegen aller Aussparungen für Versorgungsanschlüsse bzw. nach Vorgabe des örtlichen Versorgungsunternehmens
- PE-Folie unter der Fundamentplatte
- Perimeterdämmung D = 60 mm unter der Fundamentplatte. Die Verlegung erfolgt auf der kundenseitigen Kies-Auffüllung mit Sandschicht
- Tragende, biegesteife Fundamentplatte, nach statischer Berechnung mit einer Grundbewehrung bis zu 15 kg Stahl pro m², im Mittel D = 20 cm, Sockelhöhe H = 20 cm. Alternativ kann die Ausführung auch in Faserbeton erfolgen.
- Bei PREMIUM inklusive:
Umlaufende Perimeterdämmung, D = 100 mm, inkl. Sockelputz. Der Sockelputz sowie die Dämmung wird bis max. 30 cm Höhe angebracht.
In der Leistungsstufe PURE ist dies eine optionale Leistung, jedoch wird die Anbringung für die Erreichung des Effizienzhaus 40 Standards benötigt.

Ggf. zusätzlich erforderliche Gründungsmaßnahmen sowie die dann zusätzlich erforderlichen Verputzarbeiten werden nach Vorliegen des Bodengutachtens und Kenntnis der Höhenlage der Fundamentplatte in der Bemusterung/im technischen Baustellengespräch festgelegt und zusätzlich angeboten.

Fundamentplatten bei Doppel- und Reihenhäusern erhalten eine Trennfuge entlang der benachbarten Gebäudegrenzen, um einen perfekten Schallschutz zu gewährleisten.



KAMPA HAUS GEBÄUDEHÜLLE



Raumhöhe

KAMPA sieht für das Erdgeschoss, das Obergeschoss und das Dachgeschoss eine lichte Raumhöhe von ca. 2,55 m vor. Alternativ bietet KAMPA eine Erhöhung der lichten Raumhöhe um 14 cm auf ca. 2,69 m gerne an.




Außenwände

Dreischaliger Wandaufbau mit hervorragender Dämmqualität gemäß Passivhaus, U-Gefach = 0,1 W/m²K sowie mit hervorragendem Schallschutz und sommerlichen Hitzeschutz, Phasenverschiebung 14,2 Stunden.

Aufbau von innen nach außen:

- Installationsebene in Sandwichkonstruktion aus einer Holzfaserdämmplatte, 50 mm und einer hochvergüteten Hartgipsplatte, 12,5 mm (ungespachtelt)
- Ökologische Holzwerkstoffplatte, 15 mm, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Vliesdampfbremse KAMPAtex
- Holzrahmenkonstruktion, D = 160 mm, gemäß statischer Berechnung
- Ausfachung der Holzrahmenkonstruktion mit Passivhausdämmwolle WLG 035
- Faserverstärkte Gipsbauplatte, 12,5 mm mit Imprägnierung
- Putzträger- und Vollwärmeelement WLG 032, 120 mm
- Armierter Grundputz
- Strukturputz, Körnung K 3, als organischer Edelputz, in Weiß oder in verschiedenen Pastelltönen wie z. B. Vanille, Apricot, Hellgrau oder in weiteren Farben nach KAMPA Farbpalette
Der Strukturputz wird fugenlos auf der Baustelle aufgebracht.

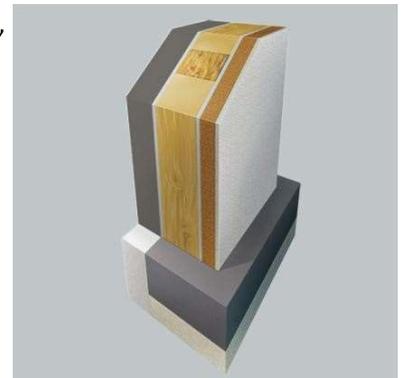

Die Gesamtwandstärke beträgt ca. 37 cm.

Im Bereich eines nicht ausgebauten Dachspitzes entfallen die Dämmung, Innenbeplankung und die Installationsebene.

Außenwände für Erker und Dachaufbauten bestehen ganz überwiegend aus Fensterelementen, haben also nur einen geringen Wandanteil. Aus optischen



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

Gründen können daher Außenwände von Erkern ohne Installationsebene ausgeführt werden. Außenseitig erhalten diese ein Putzträger-Vollwärmedämmelement WLK 032 in 60 mm statt 120 mm.

KAMPA Gebäudetrennwände bei Doppel- und Reihenhäusern erfüllen die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz gemäß DIN 4109/4102.

Wandaufbau von außen nach innen ab Oberkante Keller/Fundamentplatte:

- Hochvergütete Hartgipsplatte, zweilagig, D = 36 mm
- Holzrahmenkonstruktion, D = 160 mm, gemäß statischer Berechnung
- Ausfachung der Holzrahmenkonstruktion mit Wärme- und Schalldämmung, Passivhausdämmwolle WLK = 035
- Vliesdampfbremse KAMPAtex
- Installationsebene in massiver Sandwichkonstruktion aus einer doppellagigen, hochvergüteten Hartgipsplatte, einer Holzfaserdämmplatte und einer weiteren hochvergüteten Hartgipsplatte (ungespachtelt), D = 87 mm

Die Gesamtwandstärke beträgt ca. 284 mm.

Werden Doppelhaushälften oder Reihenhäuser nicht zeitnah hintereinander (ca. 8 Wochen) errichtet, bietet KAMPA als Zusatzleistung gern die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gebäudetrennwand vor Witterungseinflüssen an.

Innenwände

Wandaufbau:

- hochvergütete Hartgipsplatte, ungespachtelt, D = 18 mm
- Holzrahmenkonstruktion, D = 100 mm, gemäß statischer Berechnung
- Ausfachung der Holzrahmenkonstruktion mit Wärme- und Schalldämmung, Mineralfaser, D = 60 mm
- hochvergütete Hartgipsplatte, ungespachtelt, D = 18 mm

Die Gesamtwandstärke beträgt ca. 136 mm.

Innenwände zur Installationsführung für Heizung, Lüftung & Sanitär werden bedarfsweise mit einer Holzrahmenkonstruktion, D = 196 mm ausgeführt.






Decke zwischen ausbaubaren Geschossen

Deckenaufbau von oben nach unten:

- Holzwerkstoffplatte, vollflächig verlegt
- Holzbalkenkonstruktion gemäß statischer Berechnung
- Wärme- und Schalldämmung aus Mineralfaser in der Balkenlage, 60 mm
- Lattung, D = 40 mm
- Gipskartonfeuerschutzplatten GKF 12,5 mm, ungespachtelt

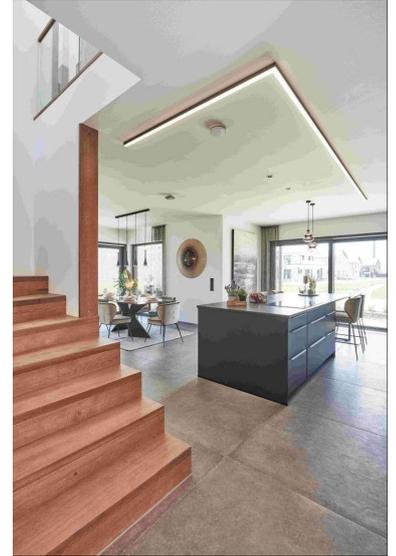

Dachkonstruktion als Flachdach

Flachdachkonstruktion für Bungalows oder zweigeschossige Häuser

Aufbau von oben nach innen:

- Umlaufende Attika mit Abdeckung
- Flachdachabdichtung mechanisch befestigt
- Schutzvlies als Trennlage
- Gefälledämmung
- Dampfsperre / Schweißbahn
- Holzwerkstoffplatte
- Balkenkonstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH) gemäß statischer Berechnung
- Lattung, D = 40 mm zur Aufnahme einer Untersparrendämmung
- Gipskartonfeuerschutzplatten GKF 12,5 mm, ungespachtelt
- Schneelast sk (auf dem Boden) bis 1,5 kN/m²






Fenster, Fenstertüren

Im KAMPA Haus werden Fenster gemäß dem Standard Effizienzhaus 40 eingebaut. Die thermische Qualität des gesamten Fensters erreicht $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Fenster und Fenstertüren sind serienmäßig ausgestattet mit:

- Drei-Scheiben-Thermoverglasung, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit warmer Kante nach DIN EN 673
- hochwertigste Rahmen- und Flügelprofile vom Marktführer Profine, frei von bleifreien Stabilisatoren und voll recyclingfähig
- außenseitig hochwetterfeste pulverbeschichtete Aluminium-Schale
- Dreifacher umlaufender, dauerelastischer Lippendichtung
- Einhand-Dreh-/Kipp-Beschläge
- volle Farbauswahl bei allen Modellen



Die Anzahl und Größe der Fenster und Fenstertüren sowie Flügelteilungen richten sich nach der vertraglich gültigen Fensterliste.

Besondere Fensterelemente z.B. im Treppenhaus, Giebelspitz, Wohnerker werden festverglast ausgeführt, wenn nicht anders angegeben. Bei Auswahl bestimmter Kombinationen von Funktionsgläsern und Fenstervarianten oder Fensterprofilen kann der U-Wert des Glases sowie die Ausführung der Widerstandsklasse RC 2 N aus technischen Gründen vom Standard abweichen.

Energieeffizienz

- Rahmen mit 7 Kammern und 3 Dichtungsebenen
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungsebenen
- intelligentes Stahl-Verstärkungskonzept reduziert Wärmebrücken und Gewicht bei noch höherer Stabilität
- Schall- und Sicherheitsgläser bis 56 mm möglich, ohne Einbußen beim Wärmeschutz

Sicherheit

- Weit innen liegende Beschläge
- Pilzkopfverriegelungen
- Bautiefe 88 mm

Elegante Erscheinung

- Schlanke Ansichtsbreiten für optimalen Lichteinfall und eine moderne Optik
- Aluminiumschale mit hochwetterfester Pulverbeschichtung

Die Anzahl und Größe der Fenster und Fenstertüren sowie Flügelteilungen richtet sich nach dem Hausgrundriss. Folgende Fenster kommen bei Ihrem Bauvorhaben zur Ausführung:

- 1,00 Stck Fenster DK 1-flügelig 0875 x 0785, EG
- 1,00 Stck Fenster DK 1-flügelig 0625 x 0665, EG
- 1,00 Stck Fenster Fest 1-teilig 2525 x 2160, EG
- 1,00 Stck Terrassentür Hebe-Schiebe 2-teilig 3000 x 2160, EG
- 1,00 Stck Terrassentür DK 1-flügelig-UT Fest 0875 x 2160, EG

5,00 Stck Summe Fenster, EG

- 1,00 Stck Fenster DK 1-flügelig 0750 x 1265, OG
- 2,00 Stck Fenster DK 1-flügelig 1125 x 1145, OG
- 1,00 Stck Fenster DK 1-flügelig 1250 x 1265, OG



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

- 2,00 Stck Fenster DK 2-flügelig 2000 x 1265, OG
 - 1,00 Stck Fenster DK 2-flügelig 1750 x 1265, OG
 - 1,00 Stck Fenster DK 2-flügelig Pfosten 2525 x 1440, OG
 - 3,00 Stck Fenster Kipp 1-flügelig 1875 x 0785, OG
- 11,00 Stck Summe Fenster, OG 1 und OG 2**

Beschattung

Zur Beschattung Ihres Hauses bietet KAMPA:

- wandintegrierte und wandbündig eingebaute Rollläden in Weiß, Anthrazit oder Silber,
- mit wärme gedämmten Rollladenkästen und Aluminium-Lamellen inklusive Aufschiebeschutz.
- Der Revisionszugang der Rollläden befindet sich außen und ermöglicht somit eine durchgehende Wohnrauminnenseite ohne sichtbare, optisch störende Rollladendeckel oder Abzeichnungen im Wandbelag.
- Die Lamellen werden aus rollgeformtem FCKW-frei ausgeschäumtem Aluminium für mehr Wohlbefinden im Haus und als zusätzliche Absicherung der Gebäudehülle ausgeführt.



Rollläden sind technisch nicht möglich bei Fenstern größer als 300 cm Breite, in Fachwerkelementen sowie bei Rund- oder Schrägfenstern. Wir bieten verschiedene Antriebsvarianten für Ihre Beschattung an. Die genaue Konfiguration entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot.

Alternativ bietet KAMPA Ihnen:

- Lamellenstores (Raffstores) aus Aluminium, elektrisch angetrieben, bis zu einer Breite von 400 cm einteilig, darüber hinaus zweiteilig

Rollogrößen lt. nachfolgender Aufstellung:

- 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 3000 x 2160, EG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 0875 x 0785, EG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 2525 x 2160, EG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 0625 x 0665, EG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 0875 x 2160, EG
 - 2,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 1125 x 1145, OG
 - 2,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 2000 x 1265, OG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 1250 x 1265, OG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 1750 x 1265, OG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 2525 x 1440, OG
 - 3,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 1875 x 0785, OG
 - 1,00 Stck Wandintegrierter Rollladen 0750 x 1265, OG
- 5,00 Stck Kurbelantrieb für Wandintegrierten Rollladen, EG
 - 11,00 Stck Kurbelantrieb für Wandintegrierten Rollladen, OG 1 und OG 2



Außenfensterbänke

Fensterbänke werden in Aluminium ausgeführt und sind damit langlebig und pflegeleicht.

Die Farbgestaltung erfolgt wahlweise in:

- weiß, pulverbeschichtet
- eloxiert natur oder
- anthrazit, als Zusatzleistung

Bei Fenstertüren die als Austritte dienen, werden Außenfensterbänke in Stein ausgeführt.



Hauseingangselement

Ihr repräsentatives Hauseingangselement aus Holz ist farblich endbehandelt gemäß KAMPA Musterpalette.

Die Ausstattung erfolgt mit:

- Ausführung in der Widerstandsklasse RC 2 für ein geschlossenes Türblatt bzw. RC 2N bei Lichtausschnitt oder Seitenteil
- umlaufender, elastischer Dichtung im Türblatt
- Lichtausschnitte mit 3-Scheiben-Thermoverglasung
- Vorbereitung für elektrischen Türöffner
- Drückergarnitur Leichtmetall, natur oder eloxiert




Treppe

Bei KAMPA ist eine hochwertige Buche-Massivholz-Treppe im Standard enthalten – diese wird wie folgt ausgeführt:

Die hochwertig gearbeitete Buche-Massivholz-Treppe führt vom EG ins DG bei eineinhalbgeschossiger Bauweise bzw. vom EG ins OG und vom OG ins DG bei zweieinhalbgeschossiger Bauweise. Die Stufen sind keilverzinkt verleimt. Das Geländer verläuft als gerader Handlauf mit zylindrischen Stäben, welche wahlweise aus Holz oder Metall sind. Das notwendige Brüstungsgeländer im OG und DG gemäß Vertragsgrundriss ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Für den KAMPA Keller werden die Umfassungswände der Treppe/das Treppenauge im Zuge des Trockenbaus beplankt, um eine entsprechende Oberfläche zu erreichen.

Sie können bereits bei Vertragsabschluss aus einer Auswahl von 14 Typen-Treppen wählen. Diese sind in der Broschüre „Ein starker Auftritt“ für sie zusammengefasst. Die detaillierte Konfiguration der Treppe wird in der Ausstattungsberatung definiert. Neben den Typen-Treppen sind viele weitere individuelle Ausführungen möglich.

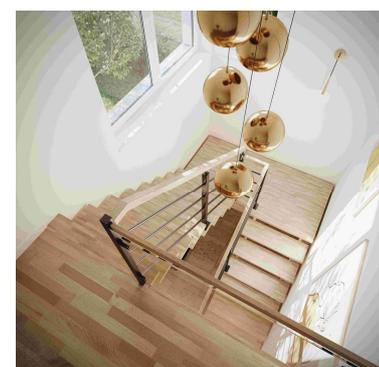



KAMPA GEBÄUDETECHNIK Belagsfertig (Ausbaustufe I)



Elektroinstallation

Die Elektroinstallation und die Erdung sind gemäß den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen VDE-Vorschriften vorgesehen. KAMPA führt für Sie sogar eine bessere Absicherung als die zur Zeit in der DIN 18015-1 vorgegebene aus.

GRUNDINSTALLATION/HAUPTVERTEILER

- Zählerschrank, Aufputzinstallation, mit eingebauter Verteilung
- Größe und Bestückung wird nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Versorgers festgelegt (Netzvoraussetzung 3-Phasen-Wechselstromnetz 400V/230V)
- Potentialausgleich (Erdung) nach den gültigen VDE-Bestimmungen
- Hauptzuleitung vom Hausanschluss zum Zählerschrank, mit max. 8 m Zuleitung
- Sofern der Hausanschluss außerhalb des Hauses ist, werden die erforderlichen Erdarbeiten bauseits vergeben und die Leitungslänge vom Haus bis zur Hausanschlusssäule zusätzlich angeboten.
- Verteiler für Breitband-Datenkommunikation in Aufputz-Montage (nach Art eines Y-Verteilers - ohne Switch-Funktion)
- Vorbereitung Photovoltaikanlage mit der erforderlichen Erweiterung des Zählerschranks sowie 2 Leerrohren DN32 vom Technikraum zum Spitzboden
- Qualitätsrauchmelder (DIN EN 14604) mit Batteriebetrieb werden in allen Aufenthaltsräumen installiert – die Anforderungen der Landesbauordnung werden übertroffen



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Das KAMPA Haus wird mit einem wirkungsvollen Überspannungsschutz für Hausanschluss, Energieversorgung, Kabelfernsehanschluss sowie Telefon und Internet ausgestattet.

ELEKTROAUSSTATTUNG

Die Ausstattung richtet sich nach den im Vertragsgrundriss angegebenen Raumbezeichnungen:

- Hauseingang:
Klingelanlage besteht aus Haustür- und Innenklingel





Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

- Flur:
 - 1 Kreuzschaltung mit 3 Schaltern (inkl. Treppe), 1 Brennstelle, 1 Steckdose
- Wohnen:
 - 1 Wechselschaltung und 1 Ausschalter für 2 Brennstellen, 1 Steckdose schaltbar über Ausschalter, 1 Einzelsteckdose, 3 Doppelsteckdosen, 1 TV-Anschlussdose für Satelliten oder Kabelempfang, 1 2-fach CAT6-LAN Anschlussdose für Datenkommunikation, 1 TAE-Anschlussdose
- Essen:
 - 1 Ausschaltung, 1 Brennstelle, 3 Steckdosen
- Kochen/Wohnküche:
 - 1 Serienschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose schaltbar über Serienschalter, 1 Einzelsteckdose, 3 Doppelsteckdosen, 1 Herdanschlussdose, 1 Steckdose für Kühlschrank, 1 Steckdose für die Spülmaschine, 1 Steckdose für Dunstabzugshaube
- Schlafen:
 - 1 Wechselschaltung, 1 Brennstelle, 3 Doppelsteckdosen, 1 2-fach CAT6-LAN Anschlussdose für Datenkommunikation, 1 TV-Anschlussdose für Satelliten oder Kabelempfang
- Kind:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 3 Doppelsteckdosen, 1 TV-Anschlussdose für Satelliten- oder Kabelempfang
- Gast:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 3 Doppelsteckdosen, 1 TV-Anschlussdose für Satelliten oder Kabelempfang
- Bad:
 - 1 Serienschalter, 2 Brennstellen (Wand oder Decke), 2 Doppelsteckdosen, 1 Steckdose für Handtuchheizkörper
- WC:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose
- Garderobe:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose
- Ankleide:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose
- Hauswirtschaftsraum:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 2 Doppelsteckdosen
- Abstellraum:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose
- Speisekammer:
 - 1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose

Angebot Vorentwurfsplanung



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

- Galerie:

1 Wechselschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose

- Technik:

1 Ausschalter, 1 Brennstelle, 1 Steckdose, 1 Außenfühlerauslass mit Steuerkabel (Außentemperaturfühler ist im Lieferumfang Heizung enthalten), je 1 Anschluss für die Heizung und die Lüftungsanlage, je 1 Steckdose für Waschmaschine und Trockner

Schalterprogramm

KAMPA liefert formschöne Großflächenschalter nach der KAMPA Musterpalette.

VISSMANN ENERGIE- UND KLIMA- LÖSUNG BEI KAMPA

Die technischen Komponenten für Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energieverwendung verstehen wir bei KAMPA als ein Gesamtsystem. Deshalb kommen sie für ein KAMPA Haus immer aus einer Hand. Sehr komfortabel in der Bedienung – mit nur einer gemeinsamen Steuerung. Außerdem werden die Systemkomponenten in einer Hand gewartet, somit ist die Zuständigkeit klar definiert.



Das VISSMANN Systemzertifikat bestätigt diesen hohen Anspruch an Energieeffizienz, Funktionssicherheit, Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit sowie Service. Und ist verbunden mit einer auf 5 Jahre verlängerten Gewährleistung, bei Einhaltung der vorgesehenen Wartungsintervalle.

VISSMANN One Base und ViCare-App

Energiemanagement zu jeder Zeit. VISSMANN One Base ist die zentrale, intelligente Steuerung aller Komponenten der VISSMANN Energie- und Klimalösung. Damit erfolgt eine nahtlose Integration der Steuerung von Heizen, Kühlen, Lüften, Warmwassererzeugung, Stromerzeugung und Stromspeicherung. Auch eine Wallbox für das E-Mobil wird mit One Base intelligent vernetzt. Das ermöglicht eine permanente Optimierung aller Energieflüsse im Haus. Und zwar prognosebasiert, unter Berücksichtigung von Wetterinformationen. Die Bedienung erfolgt mittels der ViCare-App, welche auch mit Amazon Alexa, Google Assistant und weitere verbunden werden kann.

Wärmeverteilung

Zur Wärmeverteilung in alle Wohnräume führt KAMPA eine energieeffiziente Niedertemperatur-Fußbodenheizung aus. Die Fußbodenheizung ist in die zentrale, intelligente Regelung One Base der VISSMANN Energie- und Klimalösung eingebunden. So können raumweise die Komfort-Temperatur eingestellt oder auch Zeitprogramme hinterlegt werden. One Base leistet zudem einen permanenten, hydraulischen Abgleich für besten Komfort und Energieeffizienz.





Smarte Energie- und Klimalösung invisible

VISSMANN Luft-Wasser-Wärmepumpe in Modulausführung „invisible“ (LWWP_invisible)

Die innovative VISSMANN Wärmepumpen-Generation in Modulausführung „invisible“ nutzt die Umweltwärme für energieeffizientes Heizen, Kühlen sowie die Warmwasserbereitung. Dabei vereint die LWWP_invisible neben dem Wärmepumpenaggregat auch alle weiteren hydraulischen, elektrischen und sonstigen Installations-Komponenten in einem flachen, wandhängenden Gehäuse. Auch der 250 Liter Warmwasserspeicher wird als flaches, wandhängendes Gerät ausgeführt. Heizungs- und Speichermodul sind vollkommen frei von sichtbaren Installationen. Damit wird der Aufstellraum der Wärmepumpe frei für weitere, anspruchsvolle Nutzungen.



Die Außeneinheit der Wärmepumpe wird auf einem Sockel direkt neben dem Haus aufgestellt und arbeitet flüsterleise.

Die Wärmepumpe_invisible ist in die zentrale, intelligente Regelung One Base der VISSMANN Energie- und Klimalösung eingebunden. So kann z.B. die Kühlfunktion auf Zeiten mit PV-Überschuss begrenzt werden.

Leistungsdaten:

- Heizleistung / COP: 6,8 kW / 5,0 (bei A7/W35)
- Kühlleistung / EER: 6,7 kW / 5,1 (bei A35/W18)
- Energieeffizienzklasse A+++ (W35)
- Schallleistung Inneneinheit nach ErP 40 dB(A)
- Schallleistung Außeneinheit nach ErP 58 dB(A)
- Einsatzbereich: Einfamilienhaus ohne Keller bis 230 qm Wohnfläche

VISSMANN Komfortlüftung in Modulausführung „invisible“

Die innovative VISSMANN Gerätegeneration in Modulausführung „invisible“ umfasst eine Komfortlüftung_invisible mit Enthalpietauscher, welche ebenfalls als flaches, wandhängendes Modul installiert wird.

Der Einsatz einer Komfortlüftung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung (Enthalpietauscher) sorgt für angenehmes und gesundes Wohnen durch stets frische und gefilterte Luft. Die im Haus entstehenden Beeinträchtigungen der Luftqualität wie atmungsbedingtes CO₂, Feuchtigkeit sowie Gerüche aller Art werden konstant und zugfrei nach draußen geleitet. Dazu wird verbrauchte Luft aus Bad, WC und Küche abgesaugt und über den Enthalpietauscher nach außen geführt. Frische Außenluft wird angesaugt, gefiltert, über den Enthalpietauscher vorerwärmt und in die Wohnräume geführt.



Die Installation der Luftverteiler oberhalb des Lüftungsgerätes erfolgt unsichtbar in der Decke, welche in diesem Bereich um ca. 18 cm abgehängt wird. Damit wird der Aufstellraum des Lüftungsgerätes frei für weitere anspruchsvolle Nutzungen. Im Lüftungsgerät und in den Luftverteilern sind wirkungsvolle Schalldämpfer integriert.



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

Die Komfortlüftung_invisible verfügt über integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren und ist in die zentrale, intelligente Regelung One Base der VIESSMANN Energie- und Klimalösung eingebunden. So kann eine bedarfsgerechte Regelung der Lüftungsleistung erfolgen.

Leistungsdaten:

Wärmerückgewinnung nach ErP: 80%

Feuchterückgewinnung: 84%

Nennvolumen: 230 m³/h, max. 300 m³/h

Einsatzbereich: Einfamilienhaus ohne Keller bis ca. 230 m² Wohnfläche

Sanitär-Rohinstallation

KAMPA liefert eine Sanitäranlage mit zentraler Wasserverteilung.

Enthalten sind:

- Übergangsbügel, Feinfilter mit Druckminderer, Sicherheitsgruppe
- Hochgedämmte Unterputz-Tragegestelle mit verbessertem Schallschutz und geräuscharmer Bedienung für Waschbecken und WC
- schalldämmendes Hausabflusssystem mit dreischichtigem Rohraufbau, mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken sowie Entlüftungsziegel
- Kalt- und Warmwasserleitungen mit PE-Xa Rohren für hygienische und bleifreie Trinkwasserversorgung
- Kalt- und Warmwasseranschlüsse für alle Sanitärobjekte und Küche
- Kaltwasseranschluss inkl. Abwasser für die Waschmaschine
- Bei belagsfertigen Häusern stellt KAMPA die Rohinstallation für ein bauseitig zu lieferndes und einzubauendes, bodengleiches, befliesbares Duschelement her. Die Größe der im Estrich vorzusehenden Aussparung wird im Rahmen der Ausstattungsberatung festgelegt.
- 1 Gartenzapfhahn als frostsichere Außenarmatur auf der Terrasse



Die Installation der Bäder und WC erfolgt als Vorwandinstallation oder in vormontierten KAMPA Installationswänden.

Die Leitungsverlegung erfolgt auf dem Rohfußboden bzw. in den dafür geplanten Installationschächten. Innenwände zur Installationsführung für Heizung, Lüftung & Sanitär werden bedarfsweise mit einer Holzrahmenkonstruktion, D = 196 mm, ausgeführt. Die Installation für die Küchenspüle, alle Installationen im Heizraum bzw. Technikraum sowie in Kellerräumen erfolgen auf Putz.



Calcium-Sulfat Fließestrich

KAMPA liefert den Estrich schwimmend verlegt.

ESTRICH IM KAMPA THERMOKELLER UND ERDGESCHOSS

- Sperrfolie gegen aufsteigende Feuchtigkeit im untersten Geschoss
 - Wärmedämmung
 - Trittschalldämmung
 - Calcium-Sulfat-Fließestrich
- Gesamtaufbau ca. 190 mm ohne Oberbelag



ESTRICH IM OBERGESCHOSS UND AUSGEBAUTEM DACHGESCHOSS

- Wärmedämmung
 - Trittschalldämmung
 - Calcium-Sulfat-Fließestrich
- Gesamtaufbau ca. 170 mm ohne Oberbelag

Für den Oberbelag plant KAMPA eine Stärke von 10 mm in allen Räumen.

Trockenbau

Einbau der beim Dach und Decke beschriebenen Verkleidung mit Gipskartonfeuerschutzplatten, ungespachtelt.

Blower-Door-Test

KAMPA führt einen Blower Door-Test aus, welcher den Nachweis der fachgerechten luftdichten Ausführung der Hausmontage führt.





INNENAUSBAU Fast Schlüsselfertig (Ausbaustufe II)




Innenfensterbänke

KAMPA liefert und montiert Innenfensterbänke aus Kunststein.
Alternativ bieten Ihnen KAMPA gerne Innenfensterbänke aus Naturstein an.



Fliesenarbeiten

KAMPA bietet Ihnen eine breite Fliesen-Auswahl mit aktuellem Design, bei der die Gestaltung der Innenräume Freude macht. Für die Auswahl der Fliesen steht Ihnen eine Vielzahl von Farben und Strukturen namhafter Hersteller zur Verfügung.

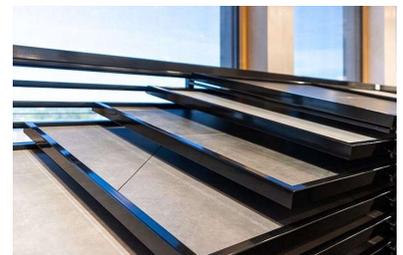

Im Angebotspreis enthalten sind Bodenfliesen gemäß Musterpalette in folgenden Räumen:

- WC
- Bad
- Abstellraum
- HWR
- Speisekammer
- Technik EG

Im Bereich von Bodenfliesen werden Sockelleisten aus Holzwerkstoff mit Dekorfolie ausgeführt. Jedoch in Bad und WC sind es Fliesensockel, außer im Bereich von Wandfliesen.

Für eine moderne Raumgestaltung sind Wandfliesen im Bereich der Sanitärobjekte in folgendem Umfang enthalten:

- Bad bzw. Komfortbad: 15 qm



- Duschbad: 6 qm
- WC: 3 qm

Sanitärobjekte/-ausstattung

Die Ausstattung richtet sich nach den im Vertragsgrundriss angegebenen Raumbezeichnungen.

Im Raum Kochen - unabhängig von Ihrer Wahl einer KAMPA-Küche:

- Jeweils ein Eckventil für Warm- und Kaltwasseranschluss



WC:

- Handwaschbecken mit Montagesatz, Einhebel-Mischbatterie mit Exzentergarnitur, Röhrengeruchsverschluss, Eckventile für Warm- und Kaltwasser
- Porzellan-Tiefspül-WC, wandhängend, mit Drückerplatte und WC-Sitz in Weiß

Bad:

- Porzellan-Waschtisch mit Montagesatz, Einhebel-Mischbatterie mit Exzentergarnitur, Röhrengeruchsverschluss, Eckventile für Warm- und Kaltwasser
- Einbauwanne als:
Rechteckwanne aus Acryl, 170/75 cm, mit Wannenträger aus Hartschaum und Einhebel-Füll- und Brausebatterie mit Duschgarnitur sowie Ab- und Überlaufgarnitur
- Dusche als bodengleiches, befließbares Duschelement je nach Haustyp in 80 x 80 cm oder 90 x 90 cm als Ecklösung mit Rinnenentwässerung an der Wand und einer 2,00 m hohen Echtglas-Duschabtrennung (eine Seite fest plus eine Tür) sowie mit Einhebel-Brausebatterie mit Brauseschlauch und Garnitur.
- Porzellan-Tiefspül-WC, wandhängend, mit Drückerplatte und WC-Sitz in Weiß



Neben der beschriebenen Ausstattung stehen Ihnen die Sanitärobjekte aus den Serien namhafter Qualitäts-Marken, wie z. B. Duravit, Villeroy & Boch, Rocca oder Vigour zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Ihnen KAMPA hochwertige Badmöbel und Accessoires im Rahmen der individuellen Bemusterung an.



FINISHARBEITEN Schlüsselfertig (Ausbaustufe III)



Wandbeläge/ Spachtel- und Malerarbeiten

Die Ausführung und Oberflächengestaltung der Wände, Decken und Dachschrägen im Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautem Dachgeschoß orientiert sich an Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen: Die Wand- und Deckenfugen werden fachgerecht gemäß Qualitätsstufe Q3 verspachtelt und weiß gestrichen.



Bodenbeläge

Für die Bodenbeläge in allen Räumen in Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautem Dachgeschoss, die nicht gefliest sind, wählen Sie aus einer breiten Palette von Materialien und Farben, um Ihr KAMPA Haus stilvoller zu gestalten: KAMPA bietet hochwertige und strapazierfähige Textilbeläge gemäß Musterpalette (Schlinge oder Velours). Ein sauberer Sockelabschluss wird mit einer Teppich-Fußleiste als Übergang zwischen Wand und Boden gewährleistet. Alternativ wird ein hochwertiger Laminatboden z.B. in Buche, kanadischem Ahorn, Eiche, amerikanischem Nussbaum inklusive Holzsockelleiste verlegt. Optional bieten wir Ihnen gemäß Musterpalette eine große Auswahl an hochwertigen Designbelägen oder Holzparkett welches inklusive Holzsockelleiste geliefert wird.



Folgende Räume erhalten einen Laminatbelag:

- Ankleide
- Flur
- Galerie
- Garderobe
- Gast
- Kind



- Kochen
- Schlafen
- Wohnen/Essen

Innentüren

Elegante, hochwertige Innentüren im Wohnkeller, Erdgeschoss, Obergeschoss und ausgebautem Dachgeschoss mit pflegeleichter Dekorbeschichtung z. B. in Ahorn, Buche, Eiche, Esche oder in Weiß mit folgenden Ausstattungsmerkmalen:

- Komforthöhe der Türen von 211 cm
- Flüsterkomfortschloss für geräuscharmes Schließen
- Röhrenspanstegplatten als Türeinlage



Formschöne Drückergarnituren erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen.

Folgende Innentüren werden als Schiebetür ausgeführt:

- 1,00 Stck Schiebetür vor der Wand PG 1 Cepal Rundkante, 0735 x 2110 x 0145, EG
- 1,00 Stck Schiebetür in der Wand PG 1 Cepal Rundkante, 0860 x 2110 x 0205, OG 1

Angebot Vorentwurfsplanung



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

SONSTIGE LEISTUNGEN UND QUALITÄTSSICHERUNG



Baugesuch

Der KAMPA Architekt führt mit Ihnen ein ausführliches Planungsgespräch vor Ort.

KAMPA erstellt für Sie die kompletten Bauantragsunterlagen (4-fach) für das KAMPA Haus mit Thermofundamentplatte bzw. Thermokeller von KAMPA, einschließlich eines KAMPA Carports oder einer KAMPA Garage.

Für Ihre Kredit- bzw. Fördermittel-Anträge stellt KAMPA zwei Planmappen (M 1:100) zur Beantragung zur Verfügung, sowie sämtliche Angaben, welche die KAMPA Leistung betreffen.

Auf Wunsch bietet KAMPA Ihnen gegen Berechnung weitere Architektenleistungen an.



Statik

KAMPA liefert Ihnen nach Anforderung der jeweiligen Landesbauordnung die statische Berechnung für das KAMPA Haus, die Thermofundamentplatte bzw. den Thermokeller von KAMPA sowie den KAMPA Carport bzw. die KAMPA Garage.

Wird die Fundamentplatte bzw. der Keller durch den Bauherrn errichtet, liefert KAMPA einen Lastenplan.



Ausführungsplanung und Bemusterung

Ausgehend von einer abgeschlossenen Baueingabepaltung erarbeitet KAMPA die Ausführungsplanung für das KAMPA Gebäude, also ggf. KAMPA Keller oder KAMPA Thermofundamentplatte, den KAMPA Holzbau sowie etwaige KAMPA Nebengebäude. Die Ausführungsplanung umfasst auch die Technische Gebäudeausstattung (TGA) mit Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro sowie Energieerzeugung und -speicherung.

Auf Basis einer Vorab-Ausführungsplanung wird im Rahmen einer mehrtägigen Bemusterung die detaillierte Ausgestaltung des Hauses, Raum für Raum, gemeinsam mit dem Bauherren ausgewählt und festgelegt. Der erfahrene KAMPA Ausstattungsberater steht hierbei umfassend zur Verfügung.



Angebot Vorentwurfsplanung



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

Die Ergebnisse der Bemusterung werden dann in der finalen Ausführungsplanung eingepflegt.

Werkplanung


KAMPA erstellt die Werkpläne für das KAMPA Haus, die Thermofundamentplatte von KAMPA, sowie den KAMPA Carport bzw. die KAMPA Garage. Die Werkpläne berücksichtigen alle bei KAMPA in Auftrag gegebenen Bauteile.

Wird die Fundamentplatte durch den Bauherrn errichtet, liefert KAMPA einen Aussparungsplan für die Fundamentplatte.



Wärmeschutznachweis für das KAMPA Haus mit KAMPA Keller oder Fundamentplatte

KAMPA erstellt unter Berücksichtigung der jeweiligen solaren Ausrichtung Ihres KAMPA Hauses und unter Berücksichtigung der geplanten Haustechnik einen detaillierten Wärmeschutznachweis mit Energieausweis gemäß den Vorgaben des Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme-Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG). Bedingt durch die individuelle Grundstückssituation des jeweiligen Bauvorhabens können die Maßnahmen, welche letztendlich zum Erreichen der gewünschten Energieeffizienzklasse erforderlich sind, erst nach Vorlage der Berechnung zum Wärmeschutz nach GEG endgültig festgelegt werden und können zu Mehrkosten führen.



Auf Wunsch des Kunden erstellt KAMPA die für die Beantragung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEE) erforderliche Bestätigung für Wohngebäude. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage einer Flurkarte/des Lageplanes mit eingezeichnetem Projekt bei KAMPA. KAMPA beauftragt hierzu ein externes Ingenieurbüro.

Wird die Fundamentplatte nicht durch KAMPA errichtet, ist die Erstellung der Energiebedarfsberechnung Sache des Bauherrn. KAMPA liefert in diesem Fall die Daten für das KAMPA Haus und die KAMPA Gebäudetechnik zur bauseitigen Erstellung des Energieausweises. Ebenso entfällt die von der KfW benötigte Bauüberwachung.

Angebot Vorentwurfsplanung



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

Lieferung

KAMPA liefert frei Baustelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, jedoch ohne Inseln. Besondere Gegebenheiten am Grundstück können zu Mehrkosten führen.



Baustelleneinrichtung

KAMPA liefert im Zuge der Baustelleneinrichtung:

- Montagekran: 60 t für Kellermontage bzw. 40 t für Hausmontage (Mehrkosten bei abweichender Ausladung möglich)
- Arbeits- und Schutzgerüst, geeignet für Montage- und Verputzarbeiten, ausgehend von einer Sockelhöhe mit 30 cm
- Baustellen-Toilette für die Zeit der KAMPA Leistung
- Abfallbeseitigung aus den von KAMPA ausgeführten Leistungen

Durch den Bauherren sind als Montagevoraussetzung die Kriterien lt. Punkt 6 der AGB sicherzustellen. Abweichungen hiervon führen zu Mehrkosten die vom Bauherrn zu tragen sind.

Bauleitung

Zur Koordination des Erdbau- und Kanalbauunternehmers sowie der Versorgungsunternehmen führt KAMPA verantwortlich einen technischen Baustellentermin rechtzeitig vor Baubeginn durch, sofern ein KAMPA Keller oder eine KAMPA Fundamentplatte beauftragt sind.

KAMPA koordiniert und überwacht verantwortlich die Ausführung der vertraglich vereinbarten KAMPA Leistungen. Hierfür erstellt KAMPA die erforderlichen Fachbauleitererklärungen.



Baubegleitung durch Sachverständigen

Die baulichen Maßnahmen zur Erfüllung der KfW-Effizienzhaus 40 Anforderungen und somit der KfW-Fördervoraussetzungen werden für das KAMPA Haus durch einen von der KfW zugelassenen Sachverständigen überprüft und die fachgerechte Ausführung bestätigt.



Angebot Vorentwurfsplanung



Bauvorhaben: Projektierung Echterstraße 4, München

Unfallverhütung

Für die Einhaltung der einschlägigen Bau- und Unfallverhütungsvorschriften sorgt im Rahmen der KAMPA Leistungen der KAMPA Bauleiter. Im Rahmen von Eigenleistungen oder durch den Bauherrn beauftragten Leistungen hat hierfür der Bauherr zu sorgen. Gleiches gilt für die Einhaltung der Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht von Baugrundstücken und baulichen Anlagen während der Bauzeit.



Gewährleistung

5 Jahre Gewährleistung gemäß BGB für Ihr KAMPA Haus.
30 Jahre Gewährleistung für die tragende Holzkonstruktion Ihres KAMPA Hauses, sofern die üblichen Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Nicht eingeschlossen sind selbstverständlich Schäden, die durch Unwetter oder andere, von KAMPA nicht zu vertretende Umstände entstanden sind.



QDF-Qualitätsrichtlinie

KAMPA verpflichtet sich zur Einhaltung der Qualitätsrichtlinie der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF). Diese beinhaltet Anforderungen an die Gesamtqualität von Gebäuden und damit zusammenhängenden Prozessen und ist geprägt von einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch unabhängige Sachverständige sowie im Rahmen von Eigenüberwachung kontinuierlich überprüft.



Leistungsverzeichnis gelesen und genehmigt:

Seiten 1 bis _____ am _____
Ort _____ Datum _____

Unterschrift Kunde(n)

Fachberater
